




Netredegørelsen 2024 – Bilag 3.5B



Bilag 3.5B

Indhold	side
1. Fjernbanen	
Oversigt over Fjernbanen	3 - 5
TIB 1 – 35	7 - 11
2. S-banen	
Oversigt over S-banen	6
TIB 810 – 880	12

Fjernbanen TIB 2-11

Netredefølrelsen 2024 - overblik 2025

-  **Nykøbing F - Rødby F**
Ringsted Femern Banen Fase II
-  **Holbæk - Kalundborg**
Perroner og Sporskifter
-  **(Vigerslev) – Jersie Fjern**
Landsdækkende sporjustering
-  **Vigerslev spor 21+22+23 – Kalvebod**
Metroprojektet
-  **Vigerslev spor 23 – København H**
Metroprojektet
-  **Kastrup St.**
Ny Kastrup Lufthavn Station



Fjernbanen TIB 23-35

Netredøgørelsen 2024 - overblik 2025


- Fredericia - Børkop
Ombygning af Egumvej
- Aarhus H
Ombygning af Aarhus H, EP og SP
- Aarhus H – (Hørning)
Ombygning Aarhus H
- Aarhus – (Brabrand)
Ombygning af Aarhus H
- Esbjerg
Ombygning af Esbjerg St
- (Skjern) – (Holstebro)
Sporformyelse Skjern - Holstebro
- Silkeborg - Funder
Afvanding



S-banen

Netredeførelsen 2024 - overblik 2025

- Hellerup - Hillerød
Spor og broarbejder
- Ballerup - Veksø
Stiunderføring

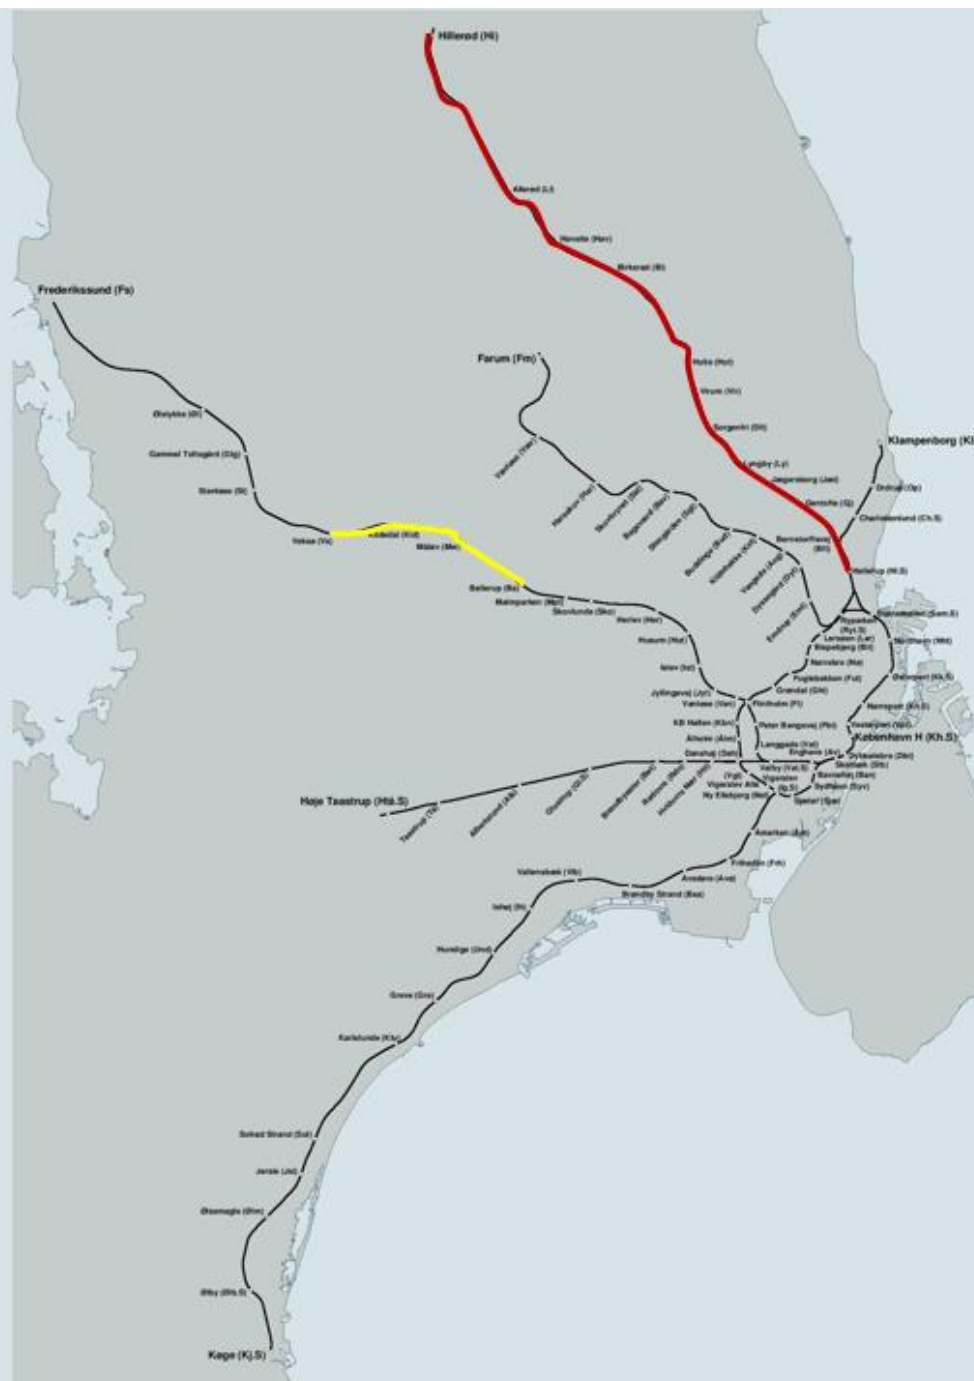

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	1	Høje Taastrup - Roskilde	Sporfornyelse Høje Taastrup - Roskilde	Sporfornylsesarbejder	6 weekender á 48 timer	Uge 12-25 og 27-32	17/3 – 10/8	Enkeltsporsdrift 4 togkanaler pr. time 1 spor ledigt mellem Høje Taastrup -Roskilde	Banedanmark	High
2	1	Høje Taastrup - Roskilde	Sporfornyelse Høje Taastrup - Roskilde	Sporfornylsesarbejder	20 uger	Uge 12-32	17/3 – 10/8	Enkeltsporsdrift 14 togkanaler pr. time 2 spor ledigt mellem Htå-Ro	Banedanmark	High
3	1	Høje Taastrup - Roskilde	Sporfornyelse Høje Taastrup - Roskilde	Sporfornylsesarbejder	8 døgn		19/7 – 27/7	Døgnspærring af spor 0	Banedanmark	High
4	1	(Ringsted) - (Fjenneslev)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)-(Slagelse)	Sporfornyelse	18 døgn		24/5 kl. 22:00 – 12/6 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
5	1	(Fjenneslev) - (Ringsted)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)-(Slagelse)	Sporfornyelse	10 døgn		12/6 kl. 22:00 – 22/6 kl. 22:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
6	1	(Sorø) - (Fjenneslev)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)-(Slagelse)	Sporfornyelse	5 døgn		22/6 kl. 04:00 – 27/6 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
7	1	Sorø St.	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)-(Slagelse)	Sporfornyelse forlængelse spor 3	11 døgn		27/6 kl. 22:00 – 8/7 kl. 04:00	Spærring af spor 3	Banedanmark	Major
8	1	(Slagelse) - (Sorø)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)-(Slagelse)	Ballastrens venstre spor So-Sg	4 døgn		8/7 kl. 04:00 – 12/7 kl. 20:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
9	1	(Ringsted) - (Slagelse)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)-(Slagelse)	Ombygning Sorø St. og sporfornyelse Fjenneslev St. spor 2	8 døgn		12/7 20:00 – 21/7 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Major
10	1	Sorø station	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)-(Slagelse)	Sporombygning/afvandning Sorø St. spor 1 og 2	21 døgn		21/7 04:00 – 11/8 04:00	Spærring af spor 1 og 2	Banedanmark	Major
11	1	(Fredericia)- (Middelfart)	NFSP0530 Sporskifter i Snoghøj	Snoghøj: Udveksling af 4 sporskifter og omisolering af Bro 20240	5 døgn		17/4-21/4	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
12	1	Snoghøj – Taulov	NFSP0530 Sporskifter i Snoghøj	Snoghøj: Udveksling af 4 sporskifter og omisolering af Bro 20240	5 døgn		17/4-21/4	Totalspærring	Banedanmark	Medium
13	1/26	(Fredericia)- (Middelfart)	NFSP0530 Sporskifter i Snoghøj	Snoghøj: Udveksling af 4 sporskifter og omisolering af Bro 20240	3 uger		30/6 – 20/7	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
14	1/26	Snoghøj – Taulov	NFSP0530 Sporskifter i Snoghøj	Snoghøj: Udveksling af 4 sporskifter og omisolering af Bro 20240	3 uger		30/6 – 20/7	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
15	1/26	(Middelfart)- (Fredericia)	NFSP0530 Sporskifter i Snoghøj	Snoghøj: Udveksling af 4 sporskifter og omisolering af Bro 20240	3 uger		21/7 – 10/8	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
16	1/26	Taulov - Snoghøj	NFSP0530 Sporskifter i Snoghøj	Snoghøj: Udveksling af 4 sporskifter og omisolering af Bro 20240	3 uger		21/7 – 10/8	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
17	2	Nykøbing Falster Vest – Rødby Færge	Ringsted Femern Banen, fase II	Udvidelse til to spor og forbindelse til Fehmern forbindelsen	1 år	Hele året og frem til 2029	1/1 – 31/12	Totalspærring, ekskl. Lollandsbanen	Banedanmark	Major
18	2	Nykøbing Falster – Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Spor, spuns og broarbejder	1 år	Hele året	1/1 – 31/12	LA40 på maks. 500 sammenhængende m. ad gangen.	Banedanmark	Major
19	2	Nykøbing Falster – Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Anslagspille: Nedbrydning af nødvendige arbejder. Klappillen: Nedbrydning af gavl / vægge	96 timer		10/1 – 13/1	Sporspærring spor 2 og 3 syd for perroner, tog fra nord kan benytte perron i spor 1, 2, 3 og 4. Lollandsbanen spærret	Banedanmark	High
20	5	Holbæk - Kalundborg	Perroner og Sporskifter, Kalundborg (Kb). NF/BR/0470.	Fornyelse/ombygning af perroner ved Kalundborg Station, samt udskiftning af sporskifterne (samtlige spor) lige øst for Kalundborg Station (Kb). Medfører totalspærring af Kb st.	10 dage Påske		11/4 – 21/4	Totalspærring	Banedanmark	High
21	6	(Vigerslev) – Jersie Fjern	Landsdækkende sporjustering	Maskinel justering	3*10 timer		17/4-21/4	Totalspærring	Banedanmark	Medium
22	11	Kalvebod – Vigerslev	METRO	Sporafstivning	2 uger		6/1 - 19/1	Enkeltsporsdrift Tog på TIB 11 via Københavns Hovedbanegård	Metro	High
23	11+ 6	Vigerslev sp. 21-22-23 - Kalvebod	METRO	Metroarbejder	56 timer Weekend		31/1 - 3/2	Enkeltsporsdrift Tog på TIB 11 via Københavns Hovedbanegård	Metro	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
								Kun 1 spor Københavns Hovedbanegård – Vigerslev -Avedøre		
24	11+6	Kalvebod – Vigerslev sp. 22 + Vigerslev sp. 23 – København H	METRO	Metroarbejder	56 timer Weekend		7/2 – 10/2	Enkeltsporsdrift Kun 1 spor Vigerslev – Kalvebod Kun 1 spor Københavns Hovedbanegård – Vigerslev -Avedøre	Metro	Medium
25	11	Kalvebod – Vigerslev	METRO	Metroarbejder	56 timer Weekend		4/7 – 7/7	Enkeltsporsdrift Spor 22 på Vigerslev spærres Kun 1 spor Vigerslev - Kalvebod	Metro	Medium
26	11	Vigerslev - Kalvebod	METRO	Metroarbejder	56 timer Weekend		11/7 - 14/7	Enkeltsporsdrift Spor 21 på Vigerslev spærres Kun 1 spor Kalvebod – Vigerslev	Metro	Medium
27	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Ilægning af sporskifter	3 døgn		28/6 – 30/6	Spærring af spor 1 og 2 øst for perron Alle tog til/fra Sverige via spor 11 og 12	Sund og Bælt	Medium
28	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Ilægning af sporskifter	2 døgn		5/7 – 6/7	Spærring af spor 11 og 12 Alle tog via spor 1 og 2	Sund og Bælt	Medium
29	23	Fredericia – (Børkop)	Ombygning af Egumvej	Broarbejde	6 uger		1/5-11/6	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
30	23	Fredericia – Børkop	Ombygning af Egumvej	Broarbejde	6 uger		31/7-10/9	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
31	23	Fredericia – Børkop	Ombygning af Egumvej	Broarbejde	6 dage		11/12-17/12	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	High
32	23+24	Aarhus H	Ombygning Aarhus H	Perronarbejder og sporarbejder Elektrificeringsprogrammet, Signalprogrammet Totalspærring af spor 7.	7 uger (opstart uge 50 2024), = 5 uger i 2025		1/1 – 3/2	Ingen parkering ved perron på Aarhus H, kun spor 2,3,4,5,6 til trafikafvikling Alle godstog til/fra havnen via spor 2	Banedanmark	Major

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
33	23+24	Aarhus H	Ombygning Aarhus H	Perronarbejder og sporarbejder Elektrificeringsprogrammet, Signalprogrammet Totalspærring af spor 6 og spor 7.	6 uger		3/2 – 17/3	Ingen parkering ved perron på Aarhus H, kun spor 2,3,4,5 til trafikafvikling Alle godstog til/fra havnen via spor 2	Banedanmark	Major
34	23+24	Aarhus H	Ombygning Aarhus H	Perronarbejder og sporarbejder Elektrificeringsprogrammet, Signalprogrammet Totalspærring af spor 5,6 og spor 7.	5 uger		17/3 – 22/4	ingen parkering ved perron på Aarhus H, kun spor 2,3,4 til trafikafvikling Alle godstog til/fra havnen via spor 2	Banedanmark	Major
35	23+24	Aarhus H	Ombygning Aarhus H	Perronarbejder og sporarbejder Elektrificeringsprogrammet, Signalprogrammet Totalspærring: Spor 4,5,6,7. Spor 50 fra dværg-signal D504 til perronspor 4,5,6,7. Spor 40 fra dværg-signal D402 til perronspor 4,5,6,7. sporkryds imellem spsk 18a/b - 17a/b.	36 uger		22/4 – 31/12	Alle tog fra syd via spor 80 el. 40/80 ingen parkering ved perron på Aarhus H kun spor 2,3 til trafikafvikling Alle godstog til/fra havnen via spor 2 Kørsel til / fra prist via spor 600.	Banedanmark	Major
36	23+24	Aarhus H	Ombygning Aarhus H	Fundering af master til kørestrøm i spor 600, 702-709, 800	7 uger		3/3 – 18/4	Enkeltsporsdrift Begrænset sporkapacitet i pristen i Ar, der arbejdes i op til 3 spor ad gangen	Banedanmark	Major
37	23+24	Aarhus H	Ombygning Aarhus H	Fundering af master til kørestrøm i spor 405 - 407	3 uger		21/4 – 9/5	Enkeltsporsdrift Begrænset sporkapacitet i 400 gruppen i Ar, der arbejdes i op til 2 spor ad gangen	Banedanmark	Major
38	23+24	Aarhus H	Ombygning af Aarhus H	Tråd trak til kørestrøm i spor 600, 702-709, 800	16 uger		16/6 – 3/10	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
								Begrænset sporkapacitet i pristen i Ar, der arbejdes i op til 3 spor ad gangen		
39	23+ 24	(Hørning) - Aarhus H	Ombygning af Aarhus H	Fundering af master til kørestrøm i spor 50 fra I 501 til dværgsignal D504	5 uger		30/6 – 1/8	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
40	23+ 24	Aarhus H – (Hørning)	Ombygning af Aarhus H	Fundering af master til kørestrøm i spor 40 fra I 401 til dværgsignal D402	5 uger		4/8 – 5/9	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
41	23+ 24	(Hørning) - Aarhus H	Ombygning af Aarhus H	Tråd trak til kørestrøm i spor 50 fra I 501 til dværgsignal D504	8 uger		6/10 – 28/11	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
42	23+ 24	(Hørning) - Aarhus H	Ombygning af Aarhus H	Tråd trak til kørestrøm i spor 50 transition zone 6A/6B fra AM2104 til I501	1 uge	4 kvartal	6/10 – 10/10 eller 24/11 - 28/11	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
43	24	Aarhus – (Brabrand)	Ombygning af Aarhus H	Fra I-signal I301 til dværg-signal D301	5 uger		22/11-31/12	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
44	29 + 31	Esbjerg station	Ombygning af Esbjerg	Sporfornyelse spor 2 samt perron spor 2-3	2 uger		22/6-06/7	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
45	29 + 31	Esbjerg station	Ombygning af Esbjerg	Sporfornyelse spor 3,4,5,6 samt perron spor 2-3	5 uger		06/7-04/8	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
46	31	(Skjern) – (Vemb)	Sporfornyelse Skjern – Holstebro	Blødbund, spor- og broarbejder Skjern - Vemb	79 døgn	Forår	14/3 – 1/6	Totalspærring	Banedanmark	Major
47	31	(Skjern) – (Holstebro)	Sporfornyelse Skjern – Holstebro	Blødbund og sporarbejder (Skjern) – (Holstebro)	22 døgn	Forår	2/6 – 24/6	Totalspærring	Banedanmark	Major
48	31	(Vemb) – (Holstebro)	Sporfornyelse Skjern – Holstebro	Sporarbejder	28 døgn	Efterår	1/9 – 29/9	Totalspærring	Banedanmark	High
49	35	Silkeborg – Funder	Afvanding	Afvandingsarbejder pga. uroligt spor	28 døgn	3 kvartal	05/7-03/8	Totalspærring	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	82	Bernstorffsvej - Lyngby	NFSP0523 (Sam-Hi)	Sporarbejder Bernstorffsvej-Lyngby	21 døgn		13/4 – 04/5	Totalspærring mellem HI station og Ly spor 3 til Ly06 og spsk 102,101b og 101a	Banedanmark	Major
2	82	Gentofte - Sorgenfri	NFSP0523 (Sam-Hi)	Sporarbejder Gentofte-Sorgenfri	23 døgn		04/5 – 26/5	Totalspærring mellem Gentofte og Sorgenfri	Banedanmark	Major
3	82	Holte - Hillerød	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Gentofte-Lyngby	22 døgn		27/5 – 17/6	Totalspærring mellem Holte og Hillerød	Banedanmark	Major
4	82	Hellerup - Gentofte	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Hellerup-Gentofte	38 døgn		17/6 – 25/7	Spærring på spor 2.hsp/spor 8	Banedanmark	Major
5	82	Hellerup - Gentofte	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Hellerup-Gentofte	31 døgn		25/7 – 24/8	Spærring på spor 4 og 5 mellem spsk 05-09b og spsk 09a-09b	Banedanmark	Major
6	86	Hellerup - Charlottenlund	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Hellerup-Charlottenlund	38 døgn		17/6 – 25/7	Spærring på spor 7, spor 6 mellem spsk 05-06b og spor 5 mellem spsk 05-09b	Banedanmark	Major
7	86	Hellerup - Charlottenlund	NFSP0523 (Sam-Hi)	Spor og broarbejder Hellerup- Charlottenlund	31 døgn		25/7 – 24/8	Spærring på spor 3	Banedanmark	Major
8	830	Ballerup - Veksø	1002901 Kildedal - ny stiunderføring i banedæmning (2019-20943)	Stiunderføring	12 døgn		7/7 – 18/7	Totalspærring	3.part	High
